



CONVENIO ADICIONAL NÚMERO 10 (DIEZ) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DGTFM-28-14, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.I. MANUEL EDUARDO GÓMEZ PARRA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, QUIEN ACTÚA ASISTIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL ARQ. ELOY GLORIA NAVA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REGULACIÓN ECONÓMICA, LA ING. PASTORA MARGARITA RAMÍREZ RUÍZ, DIRECTORA DE OBRAS Y CONTRATOS, EL LIC. MARIO ALBERTO VILLARREAL VÁZQUEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y EL LIC. MIGUEL FERRUSQUÍA CANCHOLA, DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, Y POR LA OTRA, EL CONSORCIO FORMADO POR LAS EMPRESAS "INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS", S.A. DE C.V., Y "CONSTRUCCIONES Y TRITURACIONES", S.A. DE C.V., REPRESENTADAS POR EL LIC. JOSÉ BERNARDO CASAS GODOY Y EL LIC. CLAUDIO ENRIQUE HERNÁNDEZ CAREAGA, AMBOS EN SU CARÁCTER DE APODERADOS GENERALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE SE LES DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA, COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 06 de agosto de 2014, "**LAS PARTES**" celebraron el Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DGTFM-28-14**, en lo sucesivo "**EL CONTRATO**", adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N19-2014, en términos de lo dispuesto por los Artículos 27, fracción I, y 30 de La Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas, mediante el cual "**EL CONTRATISTA**" se obligó a realizar los trabajos descritos en su Clausula PRIMERA, consistentes en la "**CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO "PORTAL PONIENTE DEL TÚNEL AL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL" DE 4.634 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON INICIO EN EL KILÓMETRO 036+150.00 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 040+784, EN EL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL FORMA PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA" por un monto de \$2,461,540,424.39 (dos mil cuatrocientos sesenta y un millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos veinticuatro pesos 39/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y considerando un plazo de ejecución de los trabajos de **750 (setecientos cincuenta) días naturales, con fecha de inicio el 07 de agosto de 2014 y de término el 25 de agosto de 2016.****

2.- Con fecha 28 de agosto de 2014, "**LAS PARTES**" celebraron el **Convenio Modificatorio número 1 (uno) a "EL CONTRATO"**, para llevar a cabo el diferimiento de la fecha de terminación de los trabajos, debido al atraso en la entrega tardía del anticipo, teniendo como nueva fecha de ejecución de los trabajos del 28 de agosto de 2014 al 15 de septiembre de 2016 respetando el plazo de ejecución de los trabajos de **750 (setecientos cincuenta) días naturales originalmente pactado.**



3.- Con fecha 21 de septiembre de 2015, "LAS PARTES" celebraron el **Convenio Modificadorio número 2 (dos)** a "EL CONTRATO", en el cual se pactó el diferimiento de la fecha de terminación de los trabajos en 389 (trescientos ochenta y nueve) días naturales, derivado de causas no imputables a "LAS PARTES", determinando como fecha de terminación de los trabajos el 09 de octubre de 2017, sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos de **750 (setecientos cincuenta)** días naturales originalmente pactado..

4.- Con fecha 31 de enero de 2017, "LAS PARTES" celebraron el **Convenio Modificadorio número 3 (tres)** a "EL CONTRATO", para llevar a cabo la modificación a determinados precios unitarios y catálogo de conceptos, sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos y el monto originalmente pactados en "EL CONTRATO".

5.- Con fecha 31 de agosto de 2017, "LAS PARTES" celebraron el **Convenio Modificadorio número 4 (cuatro)** a "EL CONTRATO", para llevar a cabo la ampliación al monto en **\$931,781,267.73 (novecientos treinta y un millones setecientos ochenta y un mil doscientos sesenta y siete pesos 73/100 M.N.)**, sin incluir el I.V.A., lo que representó un aumento del 37.85% (treinta y siete punto ochenta y cinco por ciento) con respecto al monto originalmente pactado, resultando un nuevo monto total de **\$3'393,321,692.12 (tres mil trescientos noventa y tres millones trescientos veintiún mil seiscientos noventa y dos pesos 12/100 M.N.)**, sin incluir el I.V.A.; así como un aumento al plazo de ejecución de los trabajos de **188 (ciento ochenta y ocho)** días naturales, lo que representó el 25.07% (veinticinco punto cero siete por ciento) de aumento con respecto al plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado, resultando un nuevo plazo de ejecución total de 938 (novecientos treinta y ocho) días naturales, teniendo como nueva fecha de terminación de los trabajos el 15 de abril de 2018.

6.- Con fecha 13 de abril de 2018, "LAS PARTES" celebraron el **Convenio Adicional número 5 (cinco)** a "EL CONTRATO", para llevar a cabo una ampliación al plazo de ejecución de los trabajos de **194 (ciento noventa y cuatro)** días naturales, lo que representó un aumento del 25.87% (veinticinco punto ochenta y siete por ciento) con respecto al plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado, resultando un nuevo plazo de ejecución total de 1,132 (un mil ciento treinta y dos) días naturales, y como nueva fecha de terminación de los trabajos el 26 de octubre de 2018.

7.- Con fecha 24 de octubre de 2018, "LAS PARTES" celebraron el **Convenio Adicional número 6 (seis)** a "EL CONTRATO", para llevar a cabo la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos de **66 (sesenta y seis)** días naturales, lo que representó un aumento del 8.80% (ocho punto ochenta por ciento) con respecto al plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado, resultando un nuevo plazo de ejecución total de 1,198 (un mil ciento noventa y ocho) días naturales, y como nueva fecha de terminación de los trabajos el 31 de diciembre de 2018.

8.- Con fecha 31 de diciembre de 2018, "LAS PARTES" celebraron el **Convenio Adicional número 7 (siete)** a "EL CONTRATO" para llevar a cabo la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos de **90 (noventa)** días naturales, lo que representó un aumento del 12.0% (doce por



ciento) con respecto al plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado, resultando un nuevo plazo de ejecución total de 1,288 (un mil doscientos ochenta y ocho) días naturales, y como nueva fecha de terminación de los trabajos el 31 de marzo de 2019; así mismo se pactó un aumento al monto por la cantidad de **\$290´431,423.53 (doscientos noventa millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos 53/100 M.N.)**, sin incluir el I.V.A., lo que representó un aumento del 11.80% (once punto ochenta por ciento) con respecto al monto originalmente pactado, resultando un nuevo monto total de \$3´683,753,115.65 (tres mil seiscientos ochenta y tres millones setecientos cincuenta y tres mil ciento quince pesos 65/100 M.N.) sin incluir el I.V.A.

9.- Con fecha 29 de marzo de 2019, "**LAS PARTES**" celebraron el **Convenio Adicional número 8 (ocho)** a "**EL CONTRATO**", para llevar a cabo la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos de **214 (doscientos catorce)** días naturales, lo que representó un aumento del 28.53% (veintiocho punto cincuenta y tres por ciento) con respecto al plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado, resultando un nuevo plazo de ejecución total de 1,502 (un mil quinientos dos) días naturales, y como nueva fecha de terminación de los trabajos el 31 de octubre de 2019, sin modificar el monto de los trabajos.

10.- Con fecha 31 de octubre de 2019, "**LAS PARTES**" celebraron el **Convenio Adicional número 9 (nueve)** a "**EL CONTRATO**", para llevar a cabo la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos de **61 (sesenta y uno)** días naturales, lo que representó un aumento del 8.13% (**ocho punto trece por ciento**) con respecto al plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado, resultando un nuevo plazo de ejecución total de **1,563 (un mil quinientos sesenta y tres)** días naturales, y como nueva fecha de terminación de los trabajos el **31 de diciembre de 2019**.

11.- Con fecha 20 de diciembre de 2019, mediante escrito **CEX-TIMT-SCT-626/19**, "**EL CONTRATISTA**" solicitó a la Residencia de Obra de "**EL CONTRATO**", perteneciente a "**LA DEPENDENCIA**", la celebración del Convenio Adicional Núm. 10 (diez) a "**EL CONTRATO**", tomando en consideración los argumentos y justificación expuestos y presentados mediante sus similares **CEX-TIMT-SCT-515/19** y **CEX-TIMT-SCT-535/19**, de fechas 15 y 28 de octubre del presente año, respectivamente, lo anterior ocasionado por las afectaciones que ha sufrido el proyecto, por causas no imputables a "**LAS PARTES**", mismas que quedaron contempladas en el Dictamen Técnico que fundó y motivó las causas que originaron la celebración del Convenio Adicional número 9 (nueve) a "**EL CONTRATO**" siendo este el Convenio en el cual quedo conciliado el Programa de Ejecución de los Trabajos (PET) de Obra (programa de ejecución valorizado) y el Presupuesto modificado.

12.- Con fecha 26 de diciembre de 2019, mediante oficio número **4.3.3.3-1026/2019**, "**LA DEPENDENCIA**", por conducto de su Residencia de Obra de "**EL CONTRATO**", en seguimiento a la solicitud realizada por "**EL CONTRATISTA**" relativa a la celebración del Convenio Adicional Núm. 10 (diez) a "**EL CONTRATO**", informa a este que la formalización del Convenio en mención se encuentra sujeta a la autorización de presupuestaria para el proyecto integral de transporte de pasajeros "Tren Interurbano México - Toluca".



DECLARACIONES

I.- "LA DEPENDENCIA" declara que:

I.1.- Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2.- El M.I. Manuel Eduardo Gómez Parra, en su carácter de Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como mediante nombramiento expedido a su favor por el Secretario de Comunicaciones y Transportes con oficio número 1.-379, de fecha 01 de diciembre de 2018.

I.3.- Su domicilio para los efectos del presente Convenio Adicional es el ubicado en Av. Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México..

I.4.- Derivado de los antecedentes antes mencionados, el Residente de Obra, Arq. Víctor Hugo Trujillo Galicia, con fecha **30 de diciembre de 2019**, dictaminó procedente (**Anexo 1 Dictamen Técnico**) la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, objeto de "EL CONTRATO", por lo que se requiere la celebración del presente Convenio Adicional, lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, 100, 101, 103, 105, 109 fracción II y 113 fracciones II, IV y XI de su Reglamento; así como el numeral 5.15.7 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Construcción y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (**POBALINES**) vigentes.

II.- "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.- INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A DE C.V.

II.1.1.- El Lic. José Bernardo Casas Godoy, en su carácter de Apoderado General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio Adicional, de conformidad con el contenido de la escritura pública número 109,546 de fecha 9 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Notario Público Titular número 140 en la Ciudad de México; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades con las que comparece a la firma del presente Convenio Adicional, no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna a la fecha.

II.1.2.- El Lic. Claudio Enrique Hernández Careaga, en su carácter de Apoderado General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio Adicional, de conformidad con el contenido de la escritura pública número 109,547, de fecha 9 de mayo de 2019, otorgada ante



la fe del Lic. Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Notario Público Titular número 140 en la Ciudad de México; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades con las que comparece a la firma del presente Convenio Adicional, no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna a la fecha.

II.1.3.- Conoce el alcance y contenido de las modificaciones, objeto del presente Convenio Adicional, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de las mismas.

II.1.4.- INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A DE C.V., por conducto de sus Apoderados Generales, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relación a las acciones o actividades que le deriven de la suscripción del presente instrumento, no utilizará ni mantendrá en la realización de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevará a cabo prácticas semejantes.

II.2.- CONSTRUCCIONES Y TRITURACIONES, S.A. DE C.V.

II.2.1.- El Lic. José Bernardo Casas Godoy, en su carácter de Apoderado General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio Adicional, de conformidad con el contenido de la escritura pública número 109,509 de fecha 6 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Notario Público Titular número 140 en la Ciudad de México; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades con las que comparece a la firma del presente Convenio Adicional, no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna a la fecha.

II.2.2.- El Lic. Claudio Enrique Hernández Careaga, en su carácter de Apoderado General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio Adicional, de conformidad con el contenido de la escritura pública número 109,510, de fecha 6 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Notario Público Titular número 140 en la Ciudad de México; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades con las que comparece a la firma del presente Convenio Adicional, no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna a la fecha.

II.2.3.- Conoce el alcance y contenido de las modificaciones, objeto del presente Convenio Adicional, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de las mismas.

II.2.4.- CONSTRUCCIONES Y TRITURACIONES, S.A. DE C.V., por conducto de sus Apoderados Generales, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relación a las acciones o actividades que le deriven de la suscripción del presente instrumento, no utilizará ni mantendrá en la realización de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevará a cabo prácticas semejantes.



III.- "LAS PARTES" declaran que:

III.1.- Están de acuerdo con las modificaciones objeto del presente Convenio y reconocen sus términos y alcances legales.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, 100, 103, 109 y 113 fracciones II, IV y XI de su Reglamento, es su voluntad modificar la cláusula TERCERA de "EL CONTRATO", relativa al plazo de ejecución de los trabajos, conviniendo en asumir los derechos y obligaciones que les derivan de la suscripción del presente instrumento, con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - El objeto del presente Convenio Adicional, consiste en la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos, objeto del Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DGTFM-28-14, relativo a la "CONSTRUCCION DEL TÚNEL FERROVIARIO "PORTAL PONIENTE DEL TÚNEL AL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL" DE 4.634 KILOMETROS DE LONGITUD, CON INICIO EN EL KILOMETRO 036+150.00 Y TERMINACION EN EL KILOMETRO 040+784, EN EL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL FORMA PARTE DE PROYECTO INTEGRAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA", de conformidad con los antecedentes y las declaraciones del presente instrumento.

SEGUNDA. - "LAS PARTES" convienen expresamente en modificar la cláusula TERCERA de "EL CONTRATO", correspondiente al plazo de ejecución de los trabajos, incrementándolo en **121 (ciento veintiún)** días naturales, lo que representa un **16.13% (dieciséis punto trece por ciento)** de incremento con respecto al plazo de ejecución originalmente pactado, dando como resultado un plazo de ejecución total de **1,684 (un mil seiscientos ochenta y cuatro)** días naturales, para quedar como nueva fecha de terminación de los trabajos el **30 de abril de 2020**, lo anterior conforme a la siguiente tabla:

Tabla 1. Plazos de Ejecución

Contrato/Convenio	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Plazo de Ejecución Acumulado (días naturales)	Incremento (días naturales)	% Incremento Vs Monto Original de Contrato
Contrato Núm. DGTFM-28-14	07 de agosto de 2014	25 de agosto de 2016	750	-	-
Convenio Modificadorio Núm.1 (uno) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	28 de agosto de 2014	15 septiembre de 2016	750	N/A	N/A diferimiento de 21 D.N. por entrega tardía de anticipo



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

Convenio Modificatorio Núm. 2 (dos) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	28 de agosto de 2014	09 de octubre de 2017	750	N/A	N/A diferimiento de 389 D.N. por suspensión parcial de los trabajos.
Convenio Modificatorio Núm.3 (tres) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	28 de agosto de 2014	09 de octubre de 2017	750	N/A	N/A
Convenio Modificatorio Núm.4 (cuatro) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	10 de octubre de 2017	15 de abril de 2018	938	188	25.07
Convenio Adicional Núm. 5 (cinco) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	16 de abril de 2018	26 de octubre de 2018	1,132	194	25.87
Convenio Adicional Núm.6 (seis) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	27 de octubre de 2018	31 de diciembre de 2018	1,198	66	8.80
Convenio Adicional Núm.7 (siete) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	01 de enero de 2019	31 de marzo de 2019	1,288	90	12.00
Convenio Adicional Núm. 8 (ocho) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	01 de abril de 2019	31 de octubre de 2019	1,502	214	28.53
Convenio Adicional Núm. 9 (nueve) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	01 de noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	1,563	61	8.13
Convenio Adicional Núm. 10 (diez) al Contrato Núm. DGTFM-28-14	01 de enero de 2020	30 de abril de 2020	1,684	121	16.13
TOTAL			1,684	934	124.53%

Lo anterior sin modificar el monto de los trabajos contractualmente pactado en “EL CONTRATO” de \$3’683,753,115.65 (tres mil seiscientos ochenta y tres millones setecientos cincuenta y tres mil ciento quince pesos 65/100 M.N.) sin incluir el I.V.A., y con sujeción a la autorización presupuestal del presente ejercicio fiscal.

TERCERA. - “LAS PARTES” expresan su conformidad con la modificación a que se contrae la cláusula TERCERA de “EL CONTRATO” y, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar y concluir las obras citadas, de conformidad al plazo de ejecución de los trabajos anteriormente mencionado y de acuerdo con el presupuesto y programa de ejecución de los trabajos (PET) valorizado, que previamente aprobado por “LA DEPENDENCIA” y firmado por “LAS PARTES”, se integra al presente documento como **Anexo 2**.



CUARTA. - Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados de **"EL CONTRATO"** que se modifica y por las razones expuestas en el cuerpo del presente Convenio Adicional, **"EL CONTRATISTA"** renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente Convenio Adicional, salvo los que en el mismo se estipulan.

QUINTA. - **"EL CONTRATISTA"**, modificará según corresponda, las garantías otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en **"EL CONTRATO"**, de conformidad con lo señalado en el artículo 98 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


SEXTA. - **"LAS PARTES"** manifiestan que, las modificaciones a que se refiere el presente Convenio Adicional no implican de manera alguna novación a **"EL CONTRATO"**, por lo que lo estipulado en dicho Contrato, con excepción expresa de las modificaciones a que se contrae este instrumento, así como a sus Convenios Modificatorios 1, 2, 3, y Adicionales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 conserva su alcance y fuerza legal en los términos y condiciones originalmente pactados.

SÉPTIMA. - Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio Adicional, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Leído el presente Convenio Adicional por **"LAS PARTES"** que en el intervienen y conformes con su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman en 4 (cuatro) tantos al margen y al calce, en la Ciudad de México, a los 02 días del mes de enero del año 2020.

Por **"LA DEPENDENCIA"**

Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

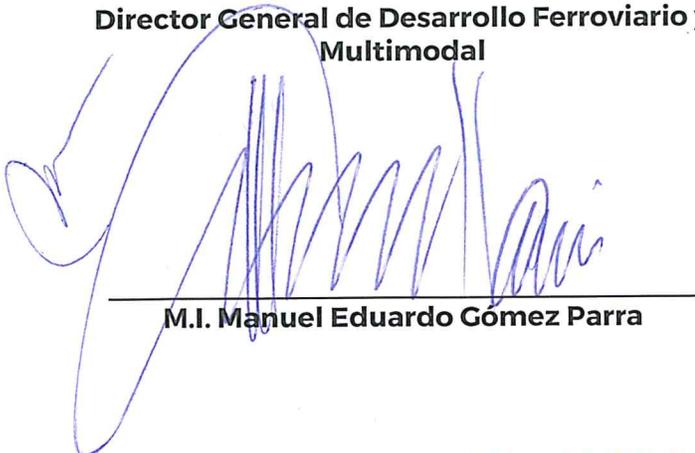

M.I. Manuel Eduardo Gómez Parra

Encargado del Despacho de la Dirección General Adjunta de Regulación Económica



Arq. Eloy Gloria Nava



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

Directora de Obras y Contratos

Ing. Pastora Margarita Ramírez Ruíz

Director de Administración

Lic. Mario Alberto Villarreal Vázquez

Director de Asuntos Legales

Lic. Miguel Ferrusquía Canchola

Por "EL CONTRATISTA"

Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.

Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V.

Lic. José Bernardo Casas Godoy
Apoderado General
Lic. José Bernardo Casas Godoy
Apoderado General
Lic. Claudio Enrique Hernández Careaga
Apoderado General
Lic. Claudio Enrique Hernández Careaga
Apoderado General

La presente hoja de firmas autógrafas forma parte del Convenio Adicional número 10 (diez) al Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DGTFM-28-14, el cual tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO "PORTAL PONIENTE DEL TÚNEL AL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL" DE 4.634 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON INICIO EN EL KILÓMETRO 036+150.00 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 040+784, EN EL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL FORMA PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA", que celebran "LAS PARTES" el 02 de enero de 2020.
